【会報 第601号】
令和5年9月14日発行

特定非営利活動法人　草加市カヌー協会

草加パドラーズ

★草加パドラーズ事務局　info@soka-paddlers.com

燃料保管庫整備

年7月26日（水）　8:30～10:30　　晴れ 微風 29℃～33℃

【参加者】清水、渋谷、吉良

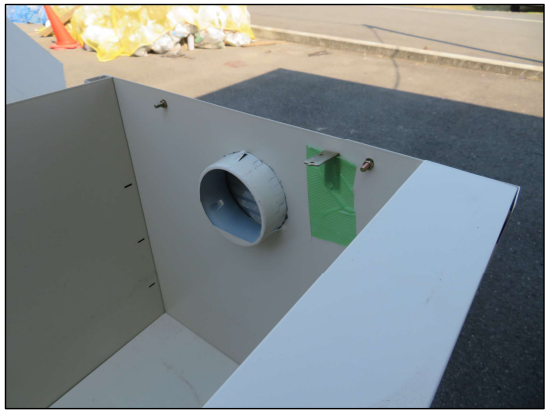

(1)ガソリン庫の石膏ボード取り付け

ガソリン庫の天板は1mm程度の鉄板1枚、その為内部温度上昇を防止
（直射日光で83度程度に上昇すると思われる）
https://www.yaneyasan.net/yaneblog/23801.html
石膏ボードは耐火性が有るし燃えない

「作業内容」
- ガソリン庫のガソリンを涼しい場所に移動
- ガソリン庫のドアを外し内部の気化したガソリンを放つ
- 天板を外し寸法測定
- 予め購入した石膏ボードを天板内側サイズにカット
- 石膏ボードを天板の下に天板固定ネジに乗せて組立

(2)消火器ボックスをガソリン庫の側面に取り付け

- ガソリン庫側面にと消火器ボックスの背面に位置を合わせて穴開け
- ガソリン庫内側から10mm×70mmmのボルトを締め付け
- ボルトに外側から30mmの隙間をあけナットを付けて消火器を設置
- ガソリン庫と消火器ボックスの間に30mmの隙間を作り風の対流させる
- 風穴のネットが剥がれていた為シリコンコーキングで接着
